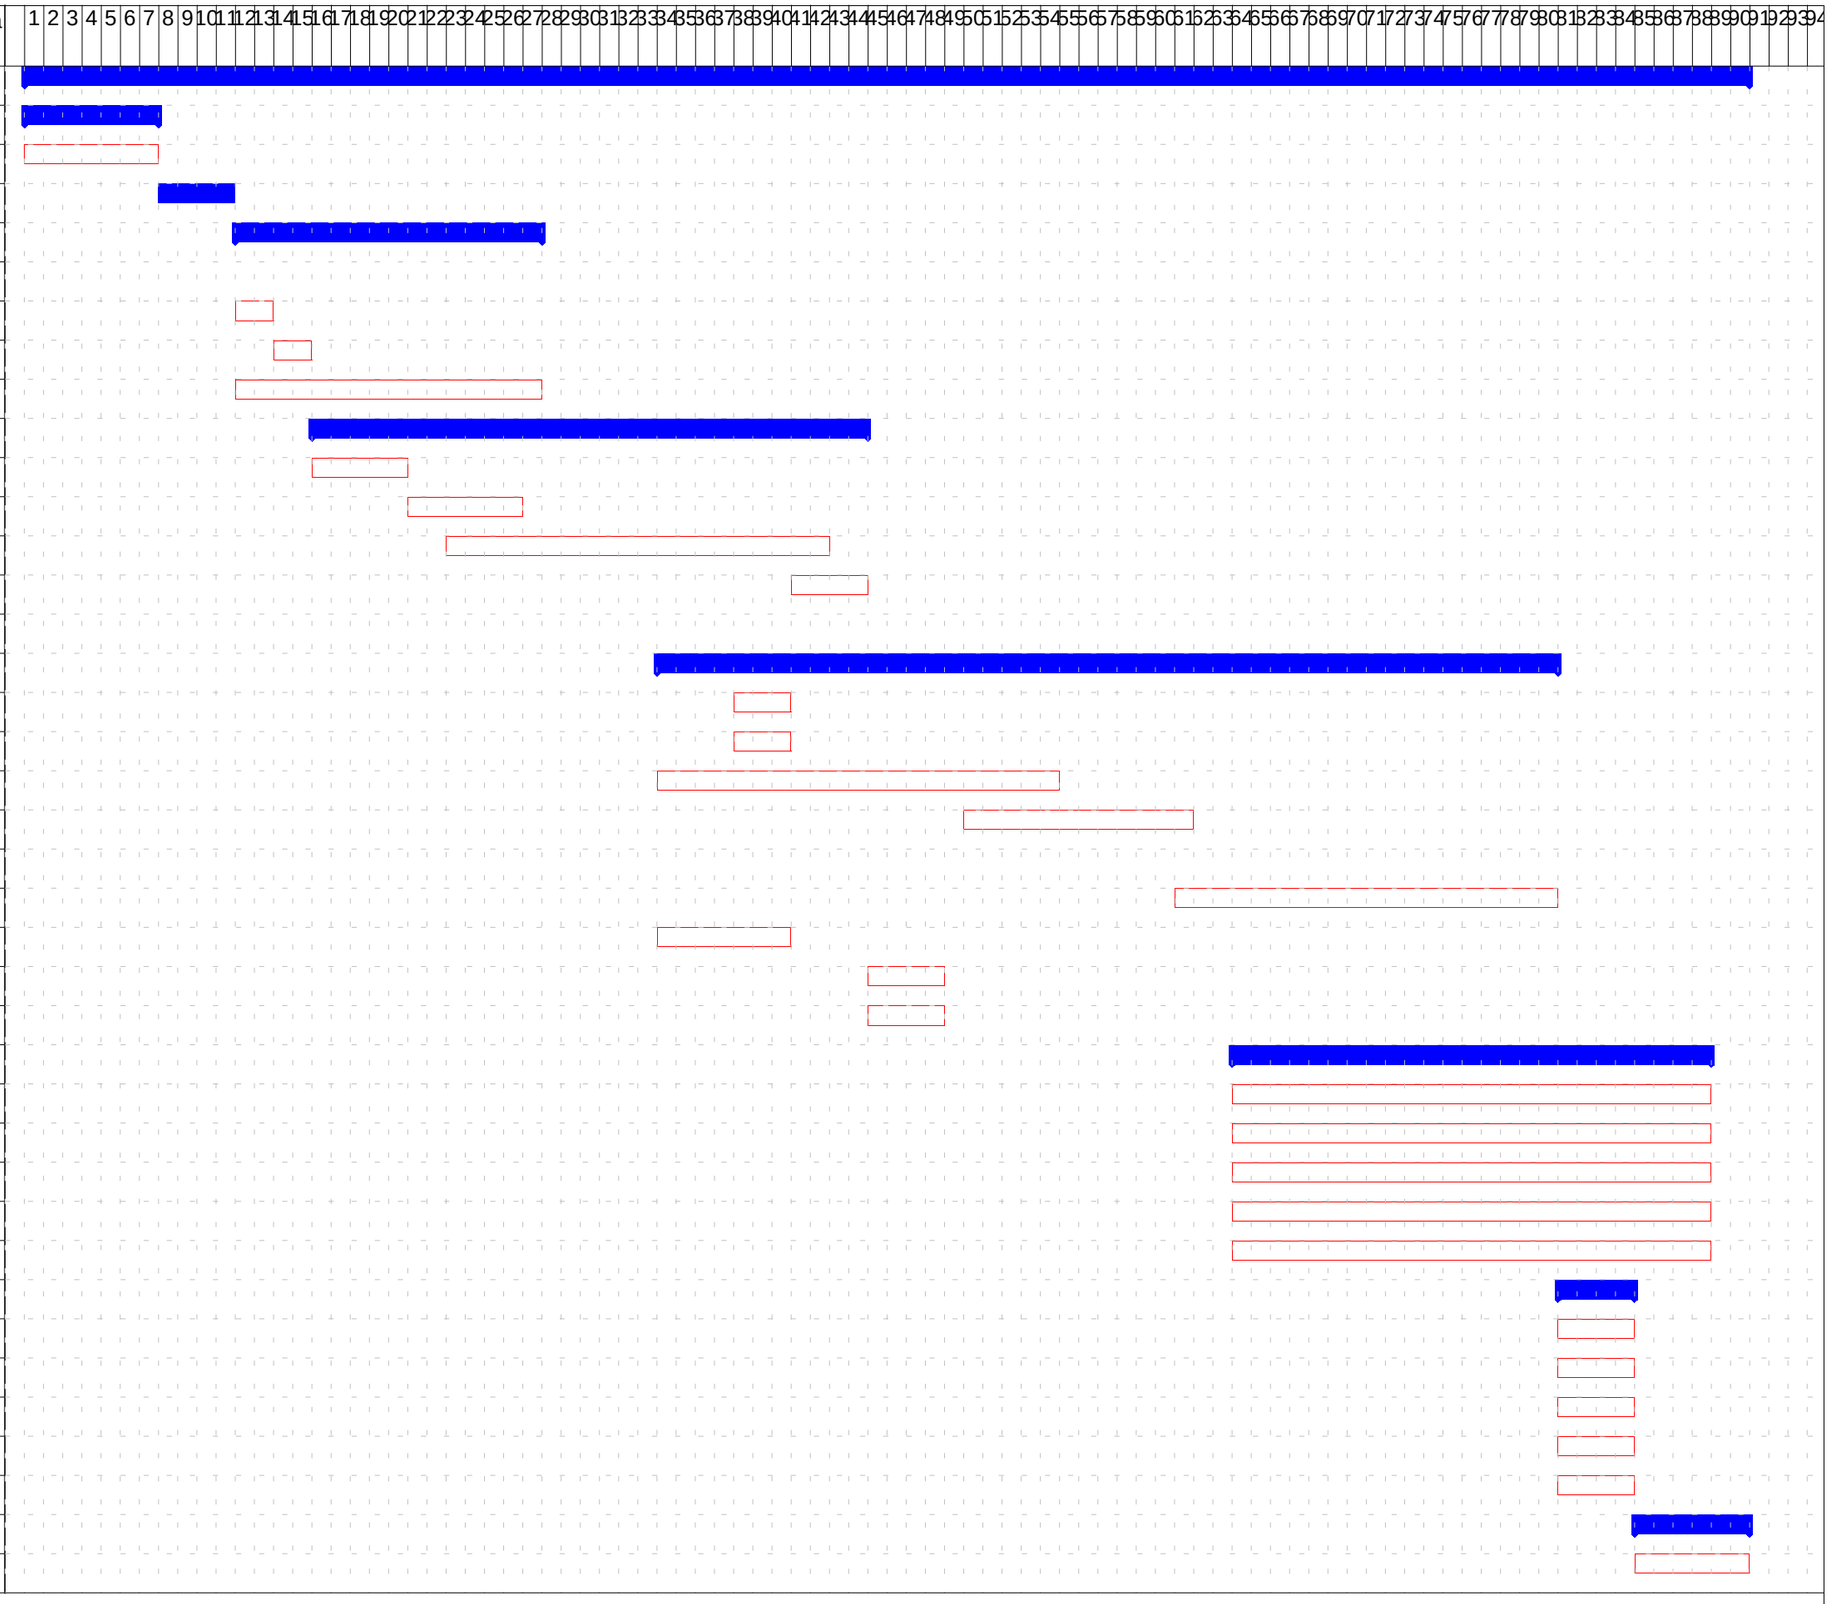ID	Nome	Durata (g):
1	Fasi di lavoro	90,00
2	APP - APPRESTAMENTI	7,00
3	PON.01 - Nolo per tutta la durata del cantiere ...ra realizzata a perfetta regola d'arte	7,00
4	BON - BONIFICA AMIANTO	4,00
5	DEM - DEMOLIZIONI	16,00
6	Rischi generali della fase:	16,00
7	D.0012.0013.0005 - Rimozione di discendenti e canali di g... onere per il conferimento a discarica	2,00
8	SAR18_PF.0012.0010.0006 - DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE... teristiche: solaio a	2,00
9	SAR18_PF.0012.0013.0011 - Smontaggio del solo manto di copertura...n tegole e coppi in laterizio o	16,00
10	RIP - RIPRISTINI COPERTURE	29,00
11	SAR18_PF.0013.0009.0003.A - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calc... realizzazione delle	5,00
12	SAR18_PF.0013.0010.0007 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINI... faccia	6,00
13	SAR18_PF.0012.0026.0023 - Riparazione di manto di copertura di t... er dare l'opera finita a regola	20,00
14	COP.02 - REVISIONE DI MANTO DI COPERTURA in teg... a discarica dei materiali di risulta	4,00
15	F.04.03.01(1) - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta	4,00
16	F.05 - FIN - INTONACI E FINITURE	47,00
17	D.0013.0004.0033 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU... a da un volume di calce e due	3,00
18	SAR18_PF.0013.0004.0039 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU... ante strato di colla	3,00
19	SAR18_PF.0013.0004.0024 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI... kg 400 di	21,00
20	F.05.01 - PULITURA SUPERFICI A MEZZO DI IDROPULITRICI	12,00
21	SAR18_PF.0012.0021.0022.A - STRATO PROTETTIVO IN BATTUTO DI COCCIO... ontrata	12,00
22	SAR18_PF.0013.0004.0065.A - INTONACHINO ESTERNO COLORATO DI FINITU... per la scelta	20,00
23	D.0012.0021.0013.A - INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TR... tervento	7,00
24	D.0013.0005.0004 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	4,00
25	T.INT.01 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... izia dei luoghi a lavorazione	4,00
26	ELET - IMPIANTO ELETTRICO	25,00
27	F.07.02.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	25,00
28	F.07.02.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	25,00
29	F.07.03 - Inserimento fili	25,00
30	F.07.04 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto	25,00
31	F.07.05 - Installazione corpi illuminanti	25,00
32	LATT - OPERE DI LATTONERIA	4,00
33	PLUV.R.80 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A... nti, eventuali curve, sfridi, tagli etc	4,00
34	SCOS.50 - CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE... i tutte le fessure e raccorderie varie	4,00
35	SCOS.40 - CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE... i tutte le fessure e raccorderie varie	4,00
36	SCOS.20 - CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE... i tutte le fessure e raccorderie varie	4,00
37	D.100 - Fornitura e posa in opera di rete zinc...chie reti presso discarica autorizzata	4,00
38	F.08 - SMOBILITAZIONE CANTIERE	6,00
39	F.08.01 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso	6,00
