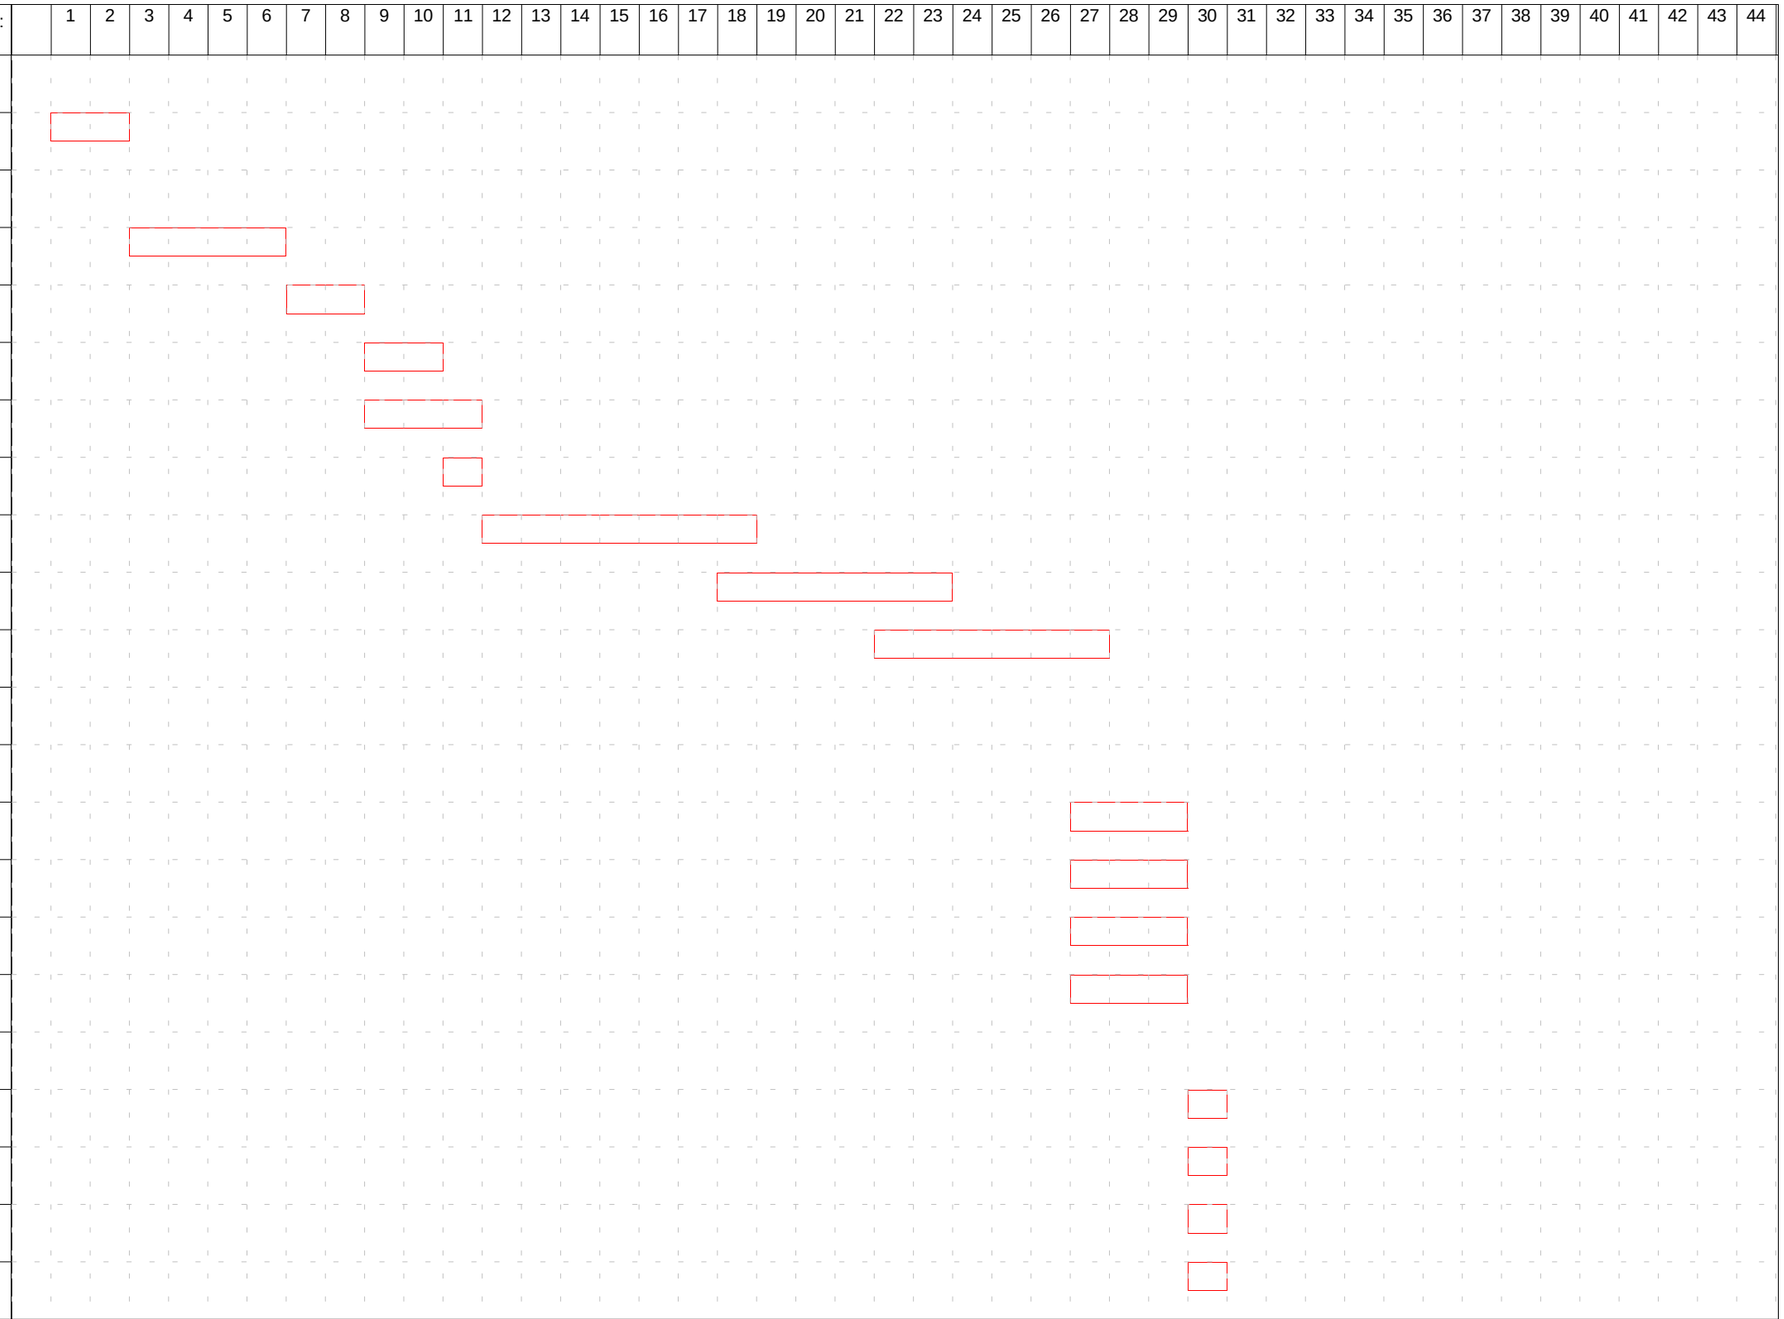ID	Nome	Durata (g): 30,00
1	Fasi di lavoro	
2	F.01 - ACCANTIERAMENTO	2,00
3	F.02 - LAVORAZIONI ZONA GUADO	
4	Taglio e rimozione di alberi e cespugli	4,00
5	Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	2,00
6	Movimentazione terra per rilevato	2,00
7	Trasporto del materiale di risulta degli scavi	3,00
8	Compattazione del piano di posa	1,00
9	Ripristino di protezione spondale e fondo alveo con massi di notevole dimensione con mezzi meccanici	7,00
10	Posa di armatura in ferro o rete metallica e piastre di ancoraggio	6,00
11	Getto con autobetoniera e autopompa	6,00
12	POSA STRATO DI USURA ZONA LOBOS	
13	Rischi generici delle attività	6,00
14	Consegna e carico materiali	3,00
15	Stesa binder e manto con vibrofinitrice	3,00
16	Rullatura binder con rullo metallico	3,00
17	Stesura manto con attrezzi manuali	3,00
18	F.03 - SMOBILITAZIONE CANTIERE	
19	F.01.10(1) - Smantellamento dell'accesso al cantiere	1,00
20	F.01.08(1) - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci	1,00
21	F.01.16(1) - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	1,00
22	F.01.06(1) - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)	1,00
